



Брегозащитните мероприятия се изпълняват поетапно, както следва:

- I. ЕТАП:
1.Брегозащитна дамба участък с тетраедрони
2.Ремонт буни 204 и 205
- II. ЕТАП:
1.Крила на буни 204 и 205
2.Подводен вълнолом-праг между буна 204 и 205
3.Подводен вълнолом-праг между буна 205 и 206
- III. ЕТАП:
1.Брегозащитна дамба-участък с камъни
2.Крила на буни 206 и 207
3.Подводен вълнолом-праг между буна 206 и 207
- IV. ЕТАП:
1.Подводен риф-вълнолом
2.Изкуствен плаж

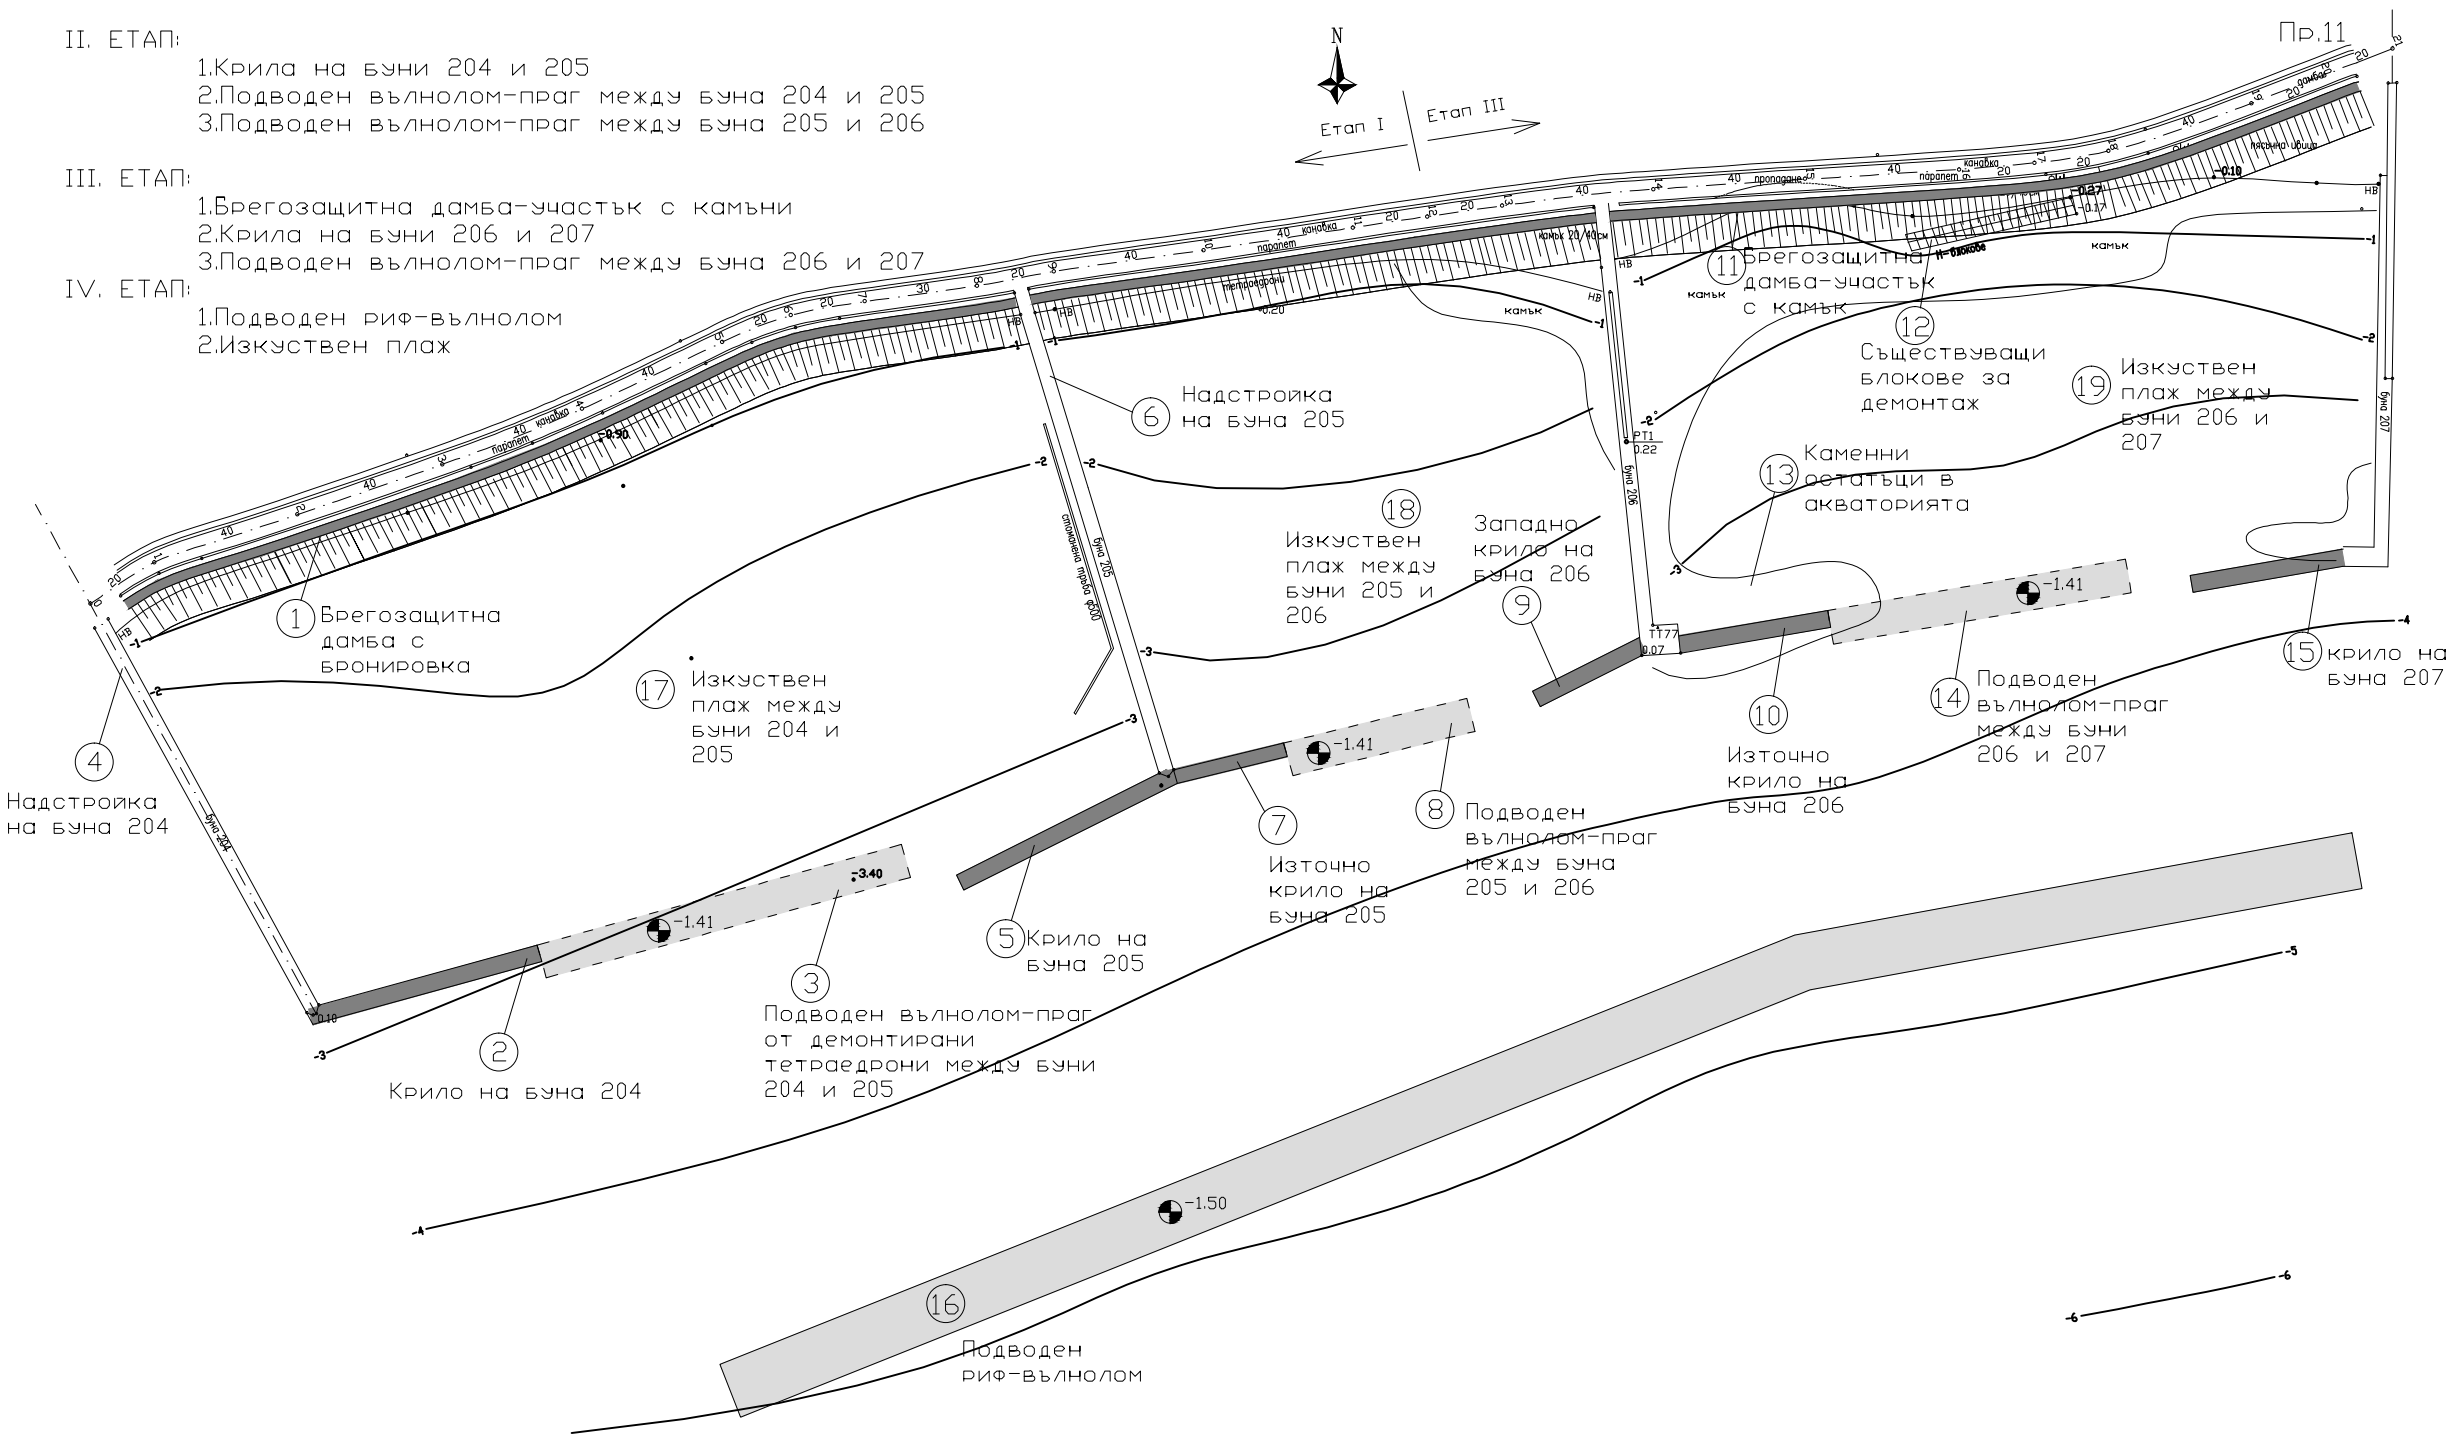

Не се допускат преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина , изпълняваща земни работи. Не се допуска къпане, плуване, риболов, сърфиране и др. в обсега на извършване на СМР с плаваща механизация!

Освен общите документи за здравословни и безопасни условия на труд следва да се спазват и изискванията на специалните документи за водолазни и подводни работи и работа с плаваща механизация.

		"ТРОЕК П ТРОЙ" ЕООД		тел.052 680-163
Обект: Защита на морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия в участъка между буна 204 и 208		Строителен ситуационен план - Схема N 1		
Част: ПБЗ	Фаза: ТП/РП	Проектант	инж.Б.Вълкова	
A3	Чертеж: 01	Комп. дизайн	инж.Б.Вълкова	
10.2010	Чертежи: 04	Управител	инж.К.Маринов	
		Инвеститор		
